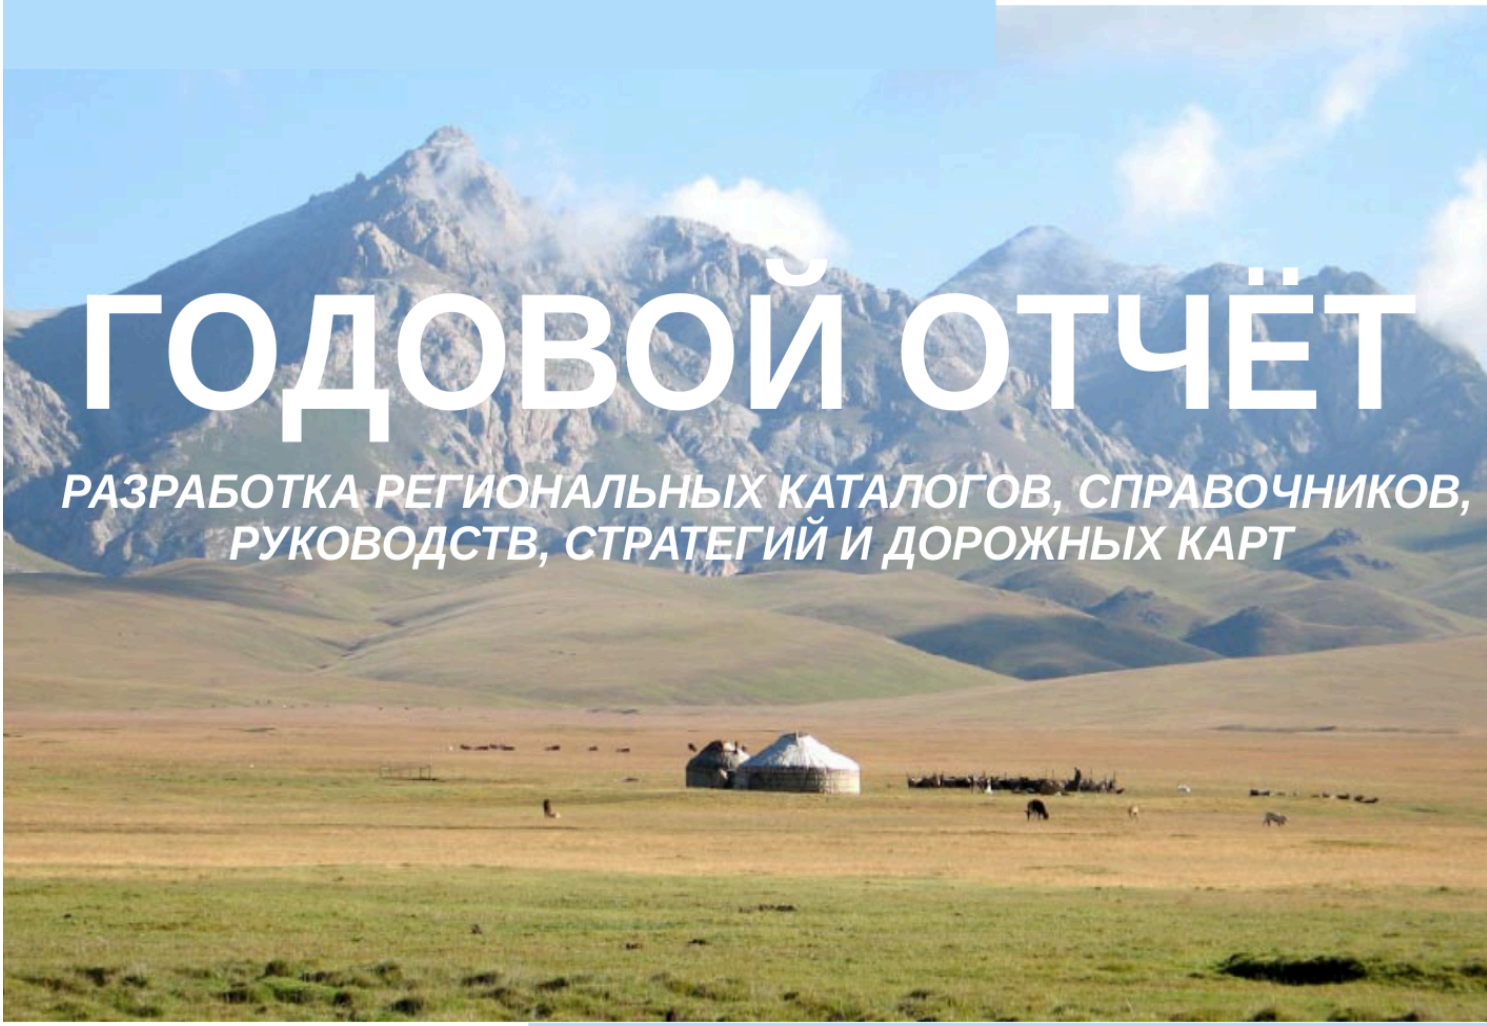


ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ КАТАЛОГОВ, СПРАВОЧНИКОВ, РУКОВОДСТВ, СТРАТЕГИЙ И ДОРОЖНЫХ КАРТ

УСТОЙЧИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ДЕКАБРЬ 2025

Контракт № KG/CS/RESILAND/MOES/DS-01

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики

А. А. Мазарипов

«__17__» __февраля__ 2026 г.

УСТОЙЧИВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Разработка региональных каталогов, справочников, руководств, стратегий и дорожных карт в рамках сотрудничества с Региональным экологическим центром Центральной Азии

Контракт № KG/CS/RESILAND/MOES/DS-01

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Июнь – декабрь 2025 года

Мамедов Б. К.

Исполнительный директор

Регионального экологического центра Центральной Азии

Декабрь 2025

Отчёт подготовлен:

- Батыр Мамедов, Исполнительный директор, Руководитель группы, Региональный экологический центр Центральной Азии (РЭЦЦА)
- Людмила Киктенко, Заместитель руководителя группы - специалист по изменению климата и управлению рисками бедствий, РЭЦЦА
- Аиша Мухамедрахим, Специалист по мониторингу и оценке, РЭЦЦА
- Окил Ширинов, Специалист по финансам, РЭЦЦА
- Азамат Кауазов, Специалист по IT и ГИС технологиям, РЭЦЦА
- Жанна Хусаинова, Специалист по коммуникации и связям с общественностью, РЭЦЦА

Дата представления отчёта: 25.12.2025

Отчёт утверждён:

- Карыбай уулу Канат, начальник Управления международного сотрудничества Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЧС КР)
- Даур Сакыев, директор Департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС КР
- Жылдыз Токторбаева, директор Отдела реализации проекта (ОРП) МЧС КР
- Чинара Бербаева, заместитель директора ОРП МЧС КР, менеджер проекта KG RESILAND
- Гулмира Калчакеева, координатор Компонента 1 проекта KG RESILAND

Настоящий отчёт подготовлен в качестве третьего результата по контракту № KG/CS/RESILAND/MOES/DS-01 между Министерством по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики и Региональным экологическим центром Центральной Азии в рамках проекта *«Устойчивое восстановление ландшафтов* в Кыргызской Республике».

Отчёт разработан РЭЦЦА за период с 3 июня 2025 года по 31 декабря 2025 года.

© РЭЦЦА, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ **1**

2. ОТЧЁТ О ХОДЕ РАБОТ **2**

Вводный отчёт **2**

Промежуточный отчёт **2**

D.1 Онлайн-каталог текущих и будущих климатических стихийных бедствий трансграничного характера в ЦА **3**

D.1.1 Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, обобщающий результаты консультаций, включая выводы и требования к каталогу 3

D.1.2 Отчёт об анализе сбора данных 4

D.1.3 Разработан дизайн (макет) онлайн-каталога текущих и будущих климатических стихийных бедствий трансграничного характера в ЦА 4

D.1.4 Отчёт о презентации и утверждении собрания РКК (слайды презентации, протоколы собраний и документация об утверждении каталога членами РКК) 4

D.1.5 Отчёт об 1 однодневном региональном семинаре для государственных служащих и исследователей с участием представителей стран ЦА по использованию каталога 5

D.1.6 План обслуживания и управления каталогом 5

D.1.7 Окончательный отчёт о завершении задачи 5

D.2 Руководство и методические рекомендации по природосберегающим решениям (ПСР), разработанные с целью расширения их применения при реагировании на селевые потоки, паводки и другие климатически обусловленные явления в ЦА **5**

D.2.1 Отчёт об исследовании и сборе данных (отчёт по результатам первоначального исследования и сбора данных для определения целей и сферы применения пособия, сбор передового опыта и примеров успешных ПСР в регионе) 5

D.2.2 Отчёт об анализе эффективности и затрат-выгод НБС (оценка эффективности, масштабируемости и экономической эффективности различных подходов НБС и рекомендации по наиболее осуществимым решениям для Центральной Азии) 5

D.2.3 Проект руководства и отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами 6

D.2.4 Окончательный вариант руководства, рекомендаций и отчёт о распространении. 6

D.3 Региональная дорожная карта по снижению последствий селевых потоков трансграничного характера и Инвестиционный план **6**

D.3.2. Отчёт о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон (выявление ключевых заинтересованных сторон, определение их ролей и обязанностей, механизмов сотрудничества, рекомендаций по улучшению взаимодействия с заинтересованными сторонами); 7

D.3.3. Проведен 1 региональный семинар/круглый стол 7

D.3.4. Проект региональной дорожной карты и инвестиционного плана 8

D.3.5. Окончательный отчёт о региональной дорожной карте и инвестиционном плане и распространении 8

D.4 Региональные мероприятия по обмену знаниями, сотрудничеству, исследованиям, полевой работе и обучению, направленные на укрепление регионального взаимодействия в сфере снижения и смягчения последствий природных и климатических бедствий 8

D.4.1 Распространение подхода «Одно село — один продукт» (ОСОП) на региональном уровне 8

D.4.2 Поддержка организации летних школ для молодых гляциологов 9

D.4.3 Организация 3 тематических мероприятий 9

D.4.4 Организация заседаний Регионального консультативного комитета 10

D.4.5 Организация сессий в рамках Международной горной конференции 10

D.4.6 Поддержка участия представителей Кыргызстана на конференциях сторон 11

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ RESILAND CA+ 12
3.1 Гармонизация Политик 12
3.2 Региональное мероприятие по гармонизации политик 14
3.3 Онлайн-платформы 15
3.3.1 Веб-страница RESILAND CA+ на сайте РЭЦЦА 15
3.3.2 Портал по ландшафтам RESILAND CA+ 16
3.3.3 Региональная онлайн-база данных 17
3.4 Региональные системы поддержки 18
3.4.1 Система мониторинга и оценки индикаторов регионального компонента 18
3.4.2 Визибилити и коммуникация 24
4. ПРОБЛЕМЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ 27
5. ОБНОВЛЕНИЯ В КОМАНДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЭЦЦА 27
6. ПРИОРИТЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 27
7. ПРИЛОЖЕНИЯ 29

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1. Вводный отчёт 2
Рисунок 2. Промежуточный отчёт 2
Рисунок 3. Вводный отчёт по разработке онлайн-каталога 4
Рисунок 4. Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами по онлайн-каталогу 4
Рисунок 5. Методология разработки РДК 6
Рисунок 6. Аналитический обзор по селям и паводкам 6
Рисунок 7. Комплексный обзор политики 7
Рисунок 8. Отчёт о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон 7
Рисунок 9. ОСОП в первом информационном бюллетене RESILAND CA+ 8
Рисунок 10. Международная конференция «Оценка водно-энергетических ресурсов Центральной Азии и георискы в условиях изменения климата» 9
Рисунок 11. Заседание РКК 13 мая 2025 года: Ашхабад, Туркменистан 10
Рисунок 12. Региональный диалог 10 декабря 2025 года: Ташкент, Узбекистан 10
Рисунок 13. Скриншот с веб-страницы RESILAND CA+ на CARECECO.ORG 15
Рисунок 14. Скриншоты страницы проекта KG RESILAND на CARECECO.ORG 15
Рисунок 15. Панели мониторинга (дашборды) консолидированных индикаторов по трём проектам RESILAND на странице RESILAND CA+ на CARECECO.ORG 16
Рисунок 16. Прототип портала RESILAND CA+ 16
Рисунок 17. Мониторинг прогресса РЭЦЦА в рамках KG RESILAND 21
1. Матрица сбора статистики по практикам и технологиям землепользования 22
2. Матрица сбора статистики по выгодам 22
3. Матрица сбора статистики по бенефициарам 22
Рисунок 18. Рамочная система мониторинга проекта RESILAND CA+ 23
Рисунок 19. Система обмена информацией RESILAND CA+ 23
Рисунок 20. Ежемесячный инфо бюллетень №1 25
Рисунок 21. Страница веб-сайта проекта на CARECECO.ORG 25
Рисунок 22. Система мониторинга и оценки дорожной карты RESILAND CA+ 28

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВБ	Всемирный банк
ГИС	Географическая информационная система
МиО	Мониторинг и Оценка
МЧС КР	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ОРП	Отдел реализации проектов
ОСОП	Одно село - один продукт
ПСР	Природосберегающие решения
РКИК ООН	Рамочная Конвенция ООН по изменению климата
РКК	Региональный Консультативный Комитет
РЭЦЦА	Региональный экологический центр Центральной Азии
ТЗ	Техническое задание
УУЗР	Устойчивое управление земельными ресурсами
ЦА	Центральная Азия
ЦАКИК	Центральноазиатская конференция по изменению климата
ЦАКИП	Центральноазиатская платформа по изменению климата
ЧС	Чрезвычайная ситуация
IT	Информационные технологии
KG RESILAND	Проект «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике»
KWPF	Фонд партнерства Кореи и Группы Всемирного Банка
PROGREEN	Глобальное партнерство за устойчивые и стойкие ландшафты
RESILAND CA+	Программа Восстановления устойчивого ландшафта Центральной Азии
RESILAND TJ	Проект «Восстановления устойчивого ландшафта Таджикистана
RESILAND UZ	Проект «Восстановления устойчивого ландшафта Узбекистана»

1. РЕЗЮМЕ

Настоящий Годовой отчёт представляет обзор ключевых достижений, основных результатов и выполненных мероприятий за период с 3 июня по 31 декабря 2025 года в рамках проекта KG RESILAND. Договор на оказание консультационных услуг (№ KG/CS/RESILAND/MOES/DS-01) под названием *«Разработка региональных каталогов, справочников, руководств, стратегий и дорожных карт в рамках сотрудничества с Региональным экологическим центром Центральной Азии»* реализуется в рамках проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике». Срок действия договора составляет 43 месяца — с 3 июня 2025 года по 31 декабря 2028 года — и он направлен на поддержку реализации Пакета мероприятий 1 в рамках Подкомпонент 1.3 проекта KG RESILAND.

В отчётный период проектная команда обеспечила достижение целевых результатов, предусмотренных рабочим планом на 2025 год и согласованных ОРП:

- **Вводный отчёт**: сформирована операционная рамка регионального компонента, включая технический подход и методологию по четырём ключевым результатам, структуру рабочих процессов, организационные механизмы и План действий на 2025 год.
- **Промежуточный отчёт**: отражён прогресс реализации, включая материалы заседания Регионального консультативного комитета (РКК) (май 2025 года, Ашхабад), вклад в Международную горную конференцию (июнь 2025 года, Бишкек), создание системы МиО, а также выполнение Плана действий на 2025 год.
- **D.1. Разработка Онлайн-каталога климатически обусловленных стихийных бедствий**: консультант привлечён в октябре 2025 года; подготовлены вводный отчёт и проект отчёта по консультациям с заинтересованными сторонами (D1.1).
- **D.2. Разработка Руководства и методических рекомендаций по решениям, основанным на природе (ПСР)**: техническое задание подготовлено и направлено в ОРП; начало исполнения перенесено на 2026 год по запросу ОРП.
- **D.3. Разработка Региональной дорожной карты по снижению рисков селевых потоков**: консультант привлечён в ноябре 2025 года; подготовлены методология, аналитического обзора по селям и наводнениям, комплексный обзор политики по смягчению последствий селей (D 3.1), отчёт о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон (D.3.2)
- **D.4. Региональные мероприятия по обмену знаниями**: проведены два заседания РКК (Ашхабад — май 2025; Ташкент — декабрь 2025), обеспечен вклад в Международную горную конференцию (апрель 2025), оказана поддержка в проведении международной научной конференции «Водные и энергетические ресурсы и климатические риски в ЦА» (Бишкек — ноябрь 2025), а также организован Региональный диалог по гармонизации политик (Ташкент — декабрь 2025).
- **Гармонизация политик**: шесть проектов региональных политических документов были продвинуты в рамках консультационного процесса; получены официальные ответы от Таджикистана и Туркменистана; в рамках Регионального диалога проведена специализированная сессия по гармонизации политик (Ташкент — декабрь 2025).
- **Региональная система мониторинга и оценки (МиО)**: создана региональная система МиО по индикаторам РЭЦЦА, а также разработана консолидированная панель мониторинга RESILAND CA+ для отслеживания индикаторов всех проектов RESILAND.
- **Поддержка видимости и коммуникаций**: запущен веб-сайт проекта; распространено 14 публикаций, охвативших 7,179 заинтересованных сторон; разосланы два ежемесячных информационных бюллетеня на английском и русском языках.

2. ОТЧЁТ О ХОДЕ РАБОТ

Вводный отчёт

Цель 2025: 1 **Статус: Выполнено**

Вводный отчёт был представлен **18 июня 2025 года**. В нём была сформирована операционная основа регионального компонента, включая:

- **Технический подход и методологию:** разработка Онлайн-каталога, Руководств по природосберегающим решениям (ПСР), Региональной дорожной карты, а также проведение региональных мероприятий по обмену знаниями;
- **Структуру рабочих процессов:** планирование, процедуры отчётности, систему МиО, а также коммуникационную стратегию;
- **Организационную структуру:** состав проектной команды РЭЦЦА и функции (РКК;
- План действий на 2025 год и Логическую матрицу.

Данный отчёт был принят и вместе с подтверждающими приложениями доступен в Google Drive. проекта



Рисунок 1. Вводный отчёт

Промежуточный отчёт

Цель 2025: 1 **Статус: Выполнено**

Промежуточный отчёт был представлен 30 августа 2025 года. В нём отражён прогресс реализации регионального компонента, включая:

- **Региональные мероприятия и диалоги:** заседание Регионального консультативного комитета (май 2025 года, Ашхабад, Туркменистан), вклад в проведение Международной горной конференции (24–25 апреля, Бишкек, Кыргызская Республика), а также запуск двух ключевых результатов (Региональная дорожная карта и Онлайн-каталог);
- **Создание системы мониторинга и оценки (МиО):** общее рабочее пространство в Google Drive, панели мониторинга (дашборды) и сопутствующая документация;
- **Коммуникационную систему:** гармонизация процессов коммуникаций и связей с общественностью.

Данный отчёт вместе с подтверждающими приложениями доступен в Google Drive проекта **KG RESILAND.**

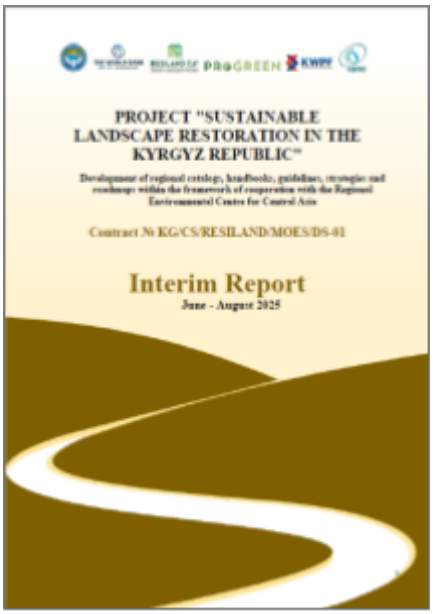


Рисунок 2. Промежуточный отчёт

D.1 Онлайн-каталог текущих и будущих климатических стихийных бедствий трансграничного характера в ЦА

Разработка онлайн-каталога ведется в два этапа:

Первый этап: Подготовка детального ТЗ для разработки онлайн-каталога. Работа ведется не ключевым консультантом, который изучает существующие примеры онлайн каталогов, проводит консультации со стейкхолдерами в Центральной Азии, готовит аналитические отчёты, предлагает структуру и функциональные возможности каталога, разрабатывает и согласовывает с заказчиком и членами РКК техническое задание для IT-компании. Консультант также собирает первичную информацию и данные для загрузки в онлайн-каталог, ведет работу IT компании для получения необходимого результата, готовит Руководство пользователей.

Второй этап: Разработка самого онлайн-каталога. На основании утверждённого технического будет привлечена IT-компания для непосредственной разработки онлайн-каталога (веб-ГИС), включая его программирование, интеграцию данных, тестирование, ввод в эксплуатацию и подготовку Руководства для технического обслуживания онлайн-каталога.

D.1.1 Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, обобщающий результаты консультаций, включая выводы и требования к каталогу

Цель 2025: D.1.1 **Статус: Выполнено**

В рамках реализации первого этапа был нанят неключевой эксперт. Процесс найма проходил через открытый конкурс: с 30 сентября по 10 октября 2025 года объявление было размещено на веб-сайте РЭЦЦА и распространялось через социальные медиа-каналы на LinkedIn и Facebook. Отборочная комиссия состояла из представителей РЭЦЦА и ОРП. Эксперт был отобран из трех заинтересованных кандидатов. Контракт с экспертом, Кыдыром Назаркуловым, был подписан 29 октября 2025 года сроком на 15 месяцев. Документы, включая протокол отбора и резюме всех кандидатов, участвовавших в конкурсе, представлены в *Приложении 3*.

Вводный отчёт эксперта предоставлен о одобрен ОРП. Отчёт описывает методологический подход к выполнению задания, источники информации, предварительный список заинтересованных сторон, вопросы для консультации, структурированные по тематическим группам задач. См. *Приложение 4*.

Проект отчёта по результатам консультации, в котором определяется масштаб каталога, требований к данным, функциональности и других ключевых показателей (D.1.1) подготовлен и прилагается к настоящему отчёту. Отчёт отражает информацию собранную из открытых источников, обобщает имеющуюся документацию и предварительные входные данные с целью определения потребностей заинтересованных сторон, релевантных для разработки онлайн-каталога. В отчёте изложены требования к ГИС-слоям, спутниковым данным, системам раннего оповещения и модулям поддержки принятия решений. *См. Приложение 5*.



ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
по разработке онлайн-каталога климатически обусловленных стихийных бедствий трансграничного характера в Центральной Азии

Заказчик: РЭЦЦА
Партнёр: МЧС КР
Исполнитель: Консультант по онлайн-каталога
Контракт: Задача «Первоначальный отчёт»
Срок реализации: Ноябрь 2025 г. — декабрь 2026 г.

г. Бишкек
2025 г.

Рисунок 3. Вводный отчёт по разработке онлайн-каталога



ОТЧЕТ
о консультациях с заинтересованными сторонами
Обобщение результатов консультаций со странами Центральной Азии, включая основные выводы и требования к онлайн-каталогу

Заказчик: РЭЦЦА
Партнёр: МЧС КР
Исполнитель:
Консультант по онлайн-каталога
Контракт: Задача D1.1
Срок реализации: Ноябрь 2025 г. — декабрь 2026 г.

г. Бишкек
2025 г.

Рисунок 4. Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами по онлайн-каталогу

D.1.2 Отчёт об анализе сбора данных (всеобъемлющий отчёт о трансграничных климатических опасностях, источниках данных, тенденциях и анализе воздействия)

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

На отчётный период отчёт об анализе сбора данных находится в процессе выполнения. В соответствии с техническим заданием (ТЗ) эксперта, представление отчёта планируется ориентировочно до 15 февраля 2026 года.

D.1.3 Разработан дизайн (макет) онлайн-каталога текущих и будущих климатических стихийных бедствий трансграничного характера в ЦА

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

В процессе заключения контракта с неключевым экспертом К. Назаркуловым по результатам обсуждения ТЗ подготовка макета онлайн каталога была перенесена на февраль 2026 год. Это необходимо для проведения консультаций с заинтересованными сторонами и определения перечня доступных данных. Соответственно, в ТЗ эксперта, согласованном с ОРП, данная задача закреплена за февралем 2026 г.

D.1.4 Отчёт о презентации и утверждении собрания РКК (слайды презентации, протоколы собраний и документация об утверждении каталога членами РКК)

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Первая презентация каталога на РКК планируется в конце 2026 года и на последующих РКК в 2027 и 2028 годах до его утверждения.

D.1.5 Отчёт об 1 однодневном региональном семинаре для государственных служащих и исследователей с участием представителей стран ЦА по использованию каталога

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Региональный семинар по обсуждению содержания и макета онлайн-каталога планируется во второй половине 2026 года.

D.1.6 План обслуживания и управления каталогом

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Разработка Руководства по обслуживанию каталога с планом необходимых работ начнется в 2027 году.

D.1.7 Окончательный отчёт о завершении задачи

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Окончательный отчёт эксперта будет подготовлен после завершения всех работ.

D.2 Руководство и методические рекомендации по природосберегающим решениям (ПСР), разработанные с целью расширения их применения при реагировании на селевые потоки, паводки и другие климатически обусловленные явления в ЦА

D.2.1 Отчёт об исследовании и сборе данных (отчёт по результатам первоначального исследования и сбора данных для определения целей и сферы применения пособия, сбор передового опыта и примеров успешных ПСР в регионе)

Цель 2025: D.2.1 **Статус: Перенесено на 2026 год по запросу ОРП**

Техническое задание для национального консультанта по ПСР было подготовлено, официально направлено в ОРП и приложено к Промежуточному отчёту. Техническое задание здесь. Работы, связанные с разработкой Руководства и рекомендаций по ПСР, запланирована во второй половине 2026 году, что позволит ОРП завершить сбор и систематизацию информации о практиках ПСР, применяемых в Кыргызской Республике.

D.2.2 Отчёт об анализе эффективности и затрат-выгод НБС (оценка эффективности, масштабируемости и экономической эффективности различных подходов НБС и рекомендации по наиболее осуществимым решениям для Центральной Азии)

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Согласно ТЗ РЭЦЦА, анализ эффективности будет проведен в 2027 году.

D.2.3 Проект руководства и отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами (проект руководства с практическими рекомендациями и отчёт об обсуждениях и отзывах с региональных мероприятий RESILAND CA+)

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Консультации со стейкхолдерами будут проведены после отбора неключевого эксперта. Отчёт по консультациям будет подготовлен по их результатам.

D.2.4 Окончательный вариант руководства, рекомендаций и отчёт о распространении.

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Окончательный отчёт эксперта будет подготовлен после завершения всех работ.

D.3 Региональная дорожная карта по снижению последствий селевых потоков трансграничного характера и Инвестиционный план

Для подготовки Региональной дорожной карты нанят неключевой эксперт. Процесс найма проходил через открытый конкурс. С 30 сентября по 10 октября 2025 года объявление было размещено на веб-сайте РЭЦЦА и распространялось через социальные медиа каналы на LinkedIn и Facebook. Отборочная комиссия состояла из представителей РЭЦЦА и ОРП. Эксперт был отобран из трех заинтересованных кандидатов. Контракт с Жыргылбеком Укашевым, был подписан 1 ноября 2025 года сроком действия до декабря 2026. Контракт с экспертом, протокол отбора и резюме всех кандидатов представлены в *Приложении 6*.



Рисунок 5. Методология разработки РДК

Вводный отчёт предоставлен о одобрен ОРП. Отчёт содержит описание методологического подхода и детальный план работ, включая подход к выполнению задания, источники информации, методы сбора данных и предварительную идентификацию заинтересованных сторон. Полный текст отчёта представлен в *Приложении 7.*



Рисунок 6. Аналитический обзор по селям и паводкам

Аналитический обзор по селям и паводкам, имеющим трансграничный характер, с акцентом на основные общие речные бассейны и на то, как изменение климата, таяние ледников и гидрологическая изменчивость усиливают трансграничные риски; в документе представлен по бассейнам анализ тенденций, последствий и уязвимостей, включая описание проблемы, статистику, воздействие и оценку стоимости, с целью содействия региональному сотрудничеству и снижению рисков. Полный текст отчёта представлен в *Приложении 8*.

D.3.1. Комплексный обзор политики по смягчению последствий селей и отчёт об анализе пробелов (анализ существующих политик, стратегий, технологий, практик, исследований и финансирования в Центральной Азии)

Цель 2025: D.3.1 Статус: Выполнено


КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЗОР
политик и мер по смягчению последствий селей и паводков в Центральной Азии, с анализом пробелов

Центральная Азия
2025 г.

Рисунок 7. Комплексный обзор политики

Комплексный обзор политик по смягчению последствий селей и отчёт об анализе пробелов приложен к настоящему отчёту. В обзоре рассматриваются комплексный обзор политик и мер по смягчению последствий селей и паводков в Центральной Азии, с анализом национальных рамок пяти стран и выявлением пробелов в системе управления, инфраструктуре, мониторинге и финансировании на скоординированное снижение трансграничных рисков и повышение климатической устойчивости. Полный текст отчёта представлен в *Приложении 9*.

D.3.2. Отчёт о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон (выявление ключевых заинтересованных сторон, определение их ролей и обязанностей, механизмов сотрудничества, рекомендаций по улучшению взаимодействия с заинтересованными сторонами);

Цель 2025: 0 Статус: Выполнено


ОТЧЕТ
о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон в использовании Региональной дорожной карты по смягчению последствий селей и паводков, имеющих трансграничный характер

Центральная Азия
2025

Рисунок 8. Отчет о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон

Отчёт о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон (D.3.2) приложен к настоящему отчёту. Отчёт представляет результаты картирования и анализа ключевых национальных и международных заинтересованных сторон, вовлеченных в использование Региональной дорожной карты по смягчению последствий селей и паводков трансграничного характера.

В нем определены их роли и механизмы взаимодействия, а также даны рекомендации по усилению координации и вовлечения в реализацию Дорожной карты и Инвестиционного плана. Полный текст отчёта представлен в *Приложении 10*.

D.3.3. Проведен 1 региональный семинар/круглый стол (по 3 участника из стран Центральной Азии) для сбора информации и обеспечения подхода, основанного на широком участии (для 35 участников). При необходимости проведение вебинара)

Цель 2025: 0 Статус: Срок выполнения не наступил

Региональный семинар в офлайн формате по обсуждению содержания и макета онлайн-каталога планируется во второй половине 2026 года.

Началась подготовка онлайн консультации с представителями линейных ведомств

D.3.4. Проект региональной дорожной карты и инвестиционного плана (структурированная дорожная карта по смягчению последствий селей и планированию инвестиций)

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Согласно ТЗ эксперта, проект дорожной карты будет выслан на комментарии РЭЦЦА и ОРП в январе 2026 года. Первое обсуждение пройдет онлайн также в январе 2026 года. Более подробное обсуждение офлайн пройдет во второй половине 2026 года.

D.3.5. Окончательный отчёт о региональной дорожной карте и инвестиционном плане и распространении

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Окончательный отчёт эксперта будет подготовлен после завершения всех работ.

D.4 Региональные мероприятия по обмену знаниями, сотрудничеству, исследованиям, полевой работе и обучению, направленные на укрепление регионального взаимодействия в сфере снижения и смягчения последствий природных и климатических бедствий

D.4.1 Распространение подхода «Одно село — один продукт» (ОСОП) на региональном уровне

Цель 2025: Коммуникация о методологии ОСОП
Статус: Начато

Подход «Одно село — один продукт» (ОСОП) способствует развитию местной экономики за счёт выявления и продвижения уникальной продукции сельских сообществ, что делает его ценной моделью для регионального тиражирования в странах Центральной Азии. В настоящее время разрабатывается специализированная коммуникационная стратегия, направленная на распространение методологии ОСОП на региональном уровне.



Рисунок 9. ОСОП в первом информационном бюллетене RESILAND CA+

Целевые коммуникационные мероприятия сыграли ключевую роль в повышении узнаваемости инициативы ОСОП. Двуязычная тематическая публикация (русском и английском), посвящённая официальному открытию Учебного центра и магазина ОСОП в городе Ош, Кыргызская Республика, была подготовлена и распространена через платформы carececo.org, ЦАКИП, информационный

бюллетень RESILAND CA+, а также через социальные сети РЭЦЦА/ЦАКИП (Facebook, X, LinkedIn, Telegram), обеспечив совокупный охват 1551 просмотр. Информационная кампания способствовала позиционированию ОСОП как практической и масштабируемой модели климатически устойчивого развития сельских сообществ и диверсификации источников средств к существованию.

D.4.2 Поддержка организации летних школ для молодых гляциологов и других соответствующих школ или семинаров, представляющих интерес для Центральной Азии, включая весенние и осенние региональные обучающие мероприятия, в Кыргызской Республике (в 2025, 2026, 2027 годах), с участием по 3 представителя от стран Центральной Азии

Цель 2025: 1 **Статус: Выполнено**



Рисунок 10. Международная конференция «Оценка водно-энергетических ресурсов Центральной Азии и георискы в условиях изменения климата»

Поддержка в организации Международной научной конференции «Оценка водно-энергетических ресурсов Центральной Азии и георискы в условиях изменения климата» (V Маматкановские чтения) состоялась 5 ноября 2025 года. Конференция была проведена Институтом водных проблем и гидроэнергетики НАН КР и стала очередными Маматкановскими чтениями — 5-й Международной научной конференцией, посвященной Дню науки и памяти академика НАН КР и РТ Дюшена Маматканова. Краткая информация о конференции, программа и список участников приведены в *Приложении 11*.

Это ежегодное мероприятия для обмена знаниями и укрепления научного сотрудничества странами региона которое проводится Институтом водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики. В рамках проекта KG RESILAND РЭЦЦА обеспечил следующую поддержку:

- административно-логистическая поддержка;
- питание 42 участников;
- расходы на участие 4 спикеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана;
- Подготовка новостей и интервью. *[См. здесь: 1, 2, 3, 4]*

D.4.3 Организация 3 тематических мероприятий с участием представителей стран Центральной Азии в целях содействия обмену знаниями и диалогу по вопросам политики в сфере снижения последствий климатических бедствий

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Цель тематических мероприятий - содержательное обсуждение результатов D.1,D.2,D.3.

В 2025 году эксперты неключевые эксперты, нанятые по задачам D.1 и D.3 провели комплексное изучение вопроса запросили поддержку РЭЦЦА в налаживании контактов с ведущими специалистами ведомств, вовлеченных в вопросы управления, мониторинга и

мобилизации ресурсов для предотвращения деградации ландшафтов от климатически обусловленных ЧС, таких как сели и паводки. В этой связи, 18 декабря 2025 года было направлено письмо в пять стран Центральной Азии с просьбой номинировать соответствующих специалистов для участия в консультациях. Первая онлайн консультация запланирована на 23 января 2026 года. Письмо с приложениями в *Приложении 12*.

D.4.4 Организация заседаний Регионального консультативного комитета (4 онлайн и 4 офлайн-заседания) с участием представителей стран ЦА в целях обеспечения непрерывного регионального диалога и принятия решений по вопросам снижения риска бедствий

Цель 2025: 1 онлайн, 1 офлайн Статус: Выполнено. 2 офлайн

1. **Заседание РКК: 13 мая 2025 года, Ашхабад, Туркменистан**



Рисунок 11. Заседание РКК 13 мая 2025 года: Ашхабад, Туркменистан

Заседание РКК было проведено параллельно с Центральноазиатской конференцией по вопросам изменения климата (ЦАКИК). На РКК участвовало 12 номинированных представителей государственных структур пяти стран ЦА, которые обсудили ход реализации проектов RESILAND и вопросы регионального сотрудничества по ландшафтам. Протокол заседания, включая повестку дня и список участников, доступен по соответствующей ссылке.

2. **Заседание РКК: 10 декабря 2025 года, Ташкент, Узбекистан**



Рисунок 12. Региональный диалог 10 декабря 2025 года: Ташкент, Узбекистан

Заседание было проведено параллельно с Региональным диалогом по устойчивому восстановлению ландшафтов в Центральной Азии на тему *«Гармонизированные подходы и региональное сотрудничество в управлении лесами и трансграничном восстановлении ландшафтов»*. В заседании приняли участие 54 участника из всех пяти стран Центральной Азии. Участники РКК традиционно обсудили ход реализации проектов RESILAND и вопросы регионального сотрудничества по ландшафтам. Протокол заседания, включая повестку дня и список участников, представлен в *Приложении 13*.

D.4.5 Организация сессий в рамках Международной горной конференции две сессии с участием по 3 представителя от стран Центральной Азии, направленные на предоставление платформы для обмена результатами исследований и передовым опытом между экспертами региона

Цель 2025: 1 **Статус: Выполнено**

РЭЦЦА оказал поддержку проведению Международной конференции «Глобальный горный диалог в интересах устойчивого развития», состоявшейся 24–25 апреля 2025 года в г. Бишкек, Кыргызская Республика. Вклад РЭЦЦА включал:

- предоставление логистической и финансовой поддержки для 14 участников, в том числе 2 международных спикера, 9 представителя стран Центральной Азии и 3 эксперта РЭЦЦА для модерации и организации выступлений;
- подготовку и проведение параллельной сессии «Содействие региональному сотрудничеству: примеры из Европы, Латинской Америки, Азии, Африки и Центральной Азии» 24 апреля 2025 года. Полный список участников и краткое резюме отчёта представлены по соответствующей ссылке.

D.4.6 Поддержка участия представителей Кыргызстана на конференциях сторон с целью продвижения программы RESILAND CA+, региональных проектов по адаптации к изменению климата, включая восстановление деградированных ландшафтов, снижение рисков бедствий и другие направления.

Цель 2025: 0 **Статус: Срок выполнения не наступил**

Поддержка участия Кыргызской Республики в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС РКИК ООН) запланирована на 2026 год.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ RESILAND CA+

Реализуемый в рамках программы RESILAND CA+, проект KG RESILAND получает также выгоды от результатов и мероприятий, осуществляемых в рамках проектов RESILAND Таджикистан и RESILAND Узбекистан. К числу таких выгод относятся:

3.1 Гармонизация шести политик, связанных с вопросами управления ландшафтами;

3.2 Участие в региональных тематических мероприятий, проводимые в рамках других проектов RESILAND;

3.3. Использование региональных платформ и онлайн-баз данных по вопросам ландшафтов;

3.4 Получение поддержки региональных систем.

3.1 Гармонизация Политик

Цель 2025: 5 проектов документов включают комментарии стран
Статус: 6 проектов документов разработано и получили первые комментарии

Гармонизация политик, направлена на продвижение трансграничного сотрудничества в области охраны природы и устойчивого управления ландшафтами, является индикатором уровня целей развития проекта (ЦРП) - это основные показатели, используемые для оценки того, достигает ли проект своих намеченных результатов и целей высокого уровня. Это значит, что успешность реализации RESILAND KG будет оцениваться в том числе по результатам гармонизации странами проекта пяти политик по ландшафтам.

Цель региональной гармонизации политик по ландшафтам - способствовать переходу от фрагментированных национальных инициатив к согласованным действиям по противодействию масштабной деградации земель. Унифицированные нормативно-правовые подходы обеспечат эффективное трансграничное управление экосистемами, позволяя странам учитывать законодательные особенности, сдерживать трансграничную незаконную деятельность и формировать скоординированный ответ на системные угрозы, такие как лесные пожары, нашествия вредителей и паводки. Таким образом, гармонизация создаёт более предсказуемую среду как для инвестиций, так и для природоохранной деятельности, одновременно снижая бюрократическую нагрузку для доноров и инвесторов. Такой упрощённый подход повышает инвестиционную привлекательность проектов по восстановлению ландшафтов, позволяя им использовать эффект масштаба и содействуя разрешению межсекторальных противоречий (преодолению «секторальной разобщённости»). Кроме того, согласованные действия способствуют социальной справедливости и стабильности, поддерживают эффективную адаптацию к изменению климата и обеспечивают необходимую связность местообитаний для выживания видов в условиях климатических изменений. Формирование общих стандартов устойчивости в конечном итоге повышает устойчивость всего региона к глобальным рыночным потрясениям и климатическим бедствиям. В этой связи, гармонизация политик имеет первостепенное значение.

При поддержке проекта RESILAND TJ были разработаны шесть проектов политических

документов, которые были направлены странам для предоставления комментариев, обсуждены и в настоящее время находятся на следующем этапе доработки:

Проект Меморандума о взаимопонимании о пересечении границ в целях природного туризма на особо охраняемых природных территориях и уникальных природных объектах — формирует рамки регионального сотрудничества. За счёт упрощения процедур пересечения границ как для туристов, так и для природоохранного персонала данный документ способствует гармонизации практик управления в сфере охраны окружающей среды и туризма. Эффективная реализация Меморандума будет способствовать усилиям по сохранению биоразнообразия и поддержанию экологического равновесия на совместно управляемых охраняемых территориях — ключевых предпосылок устойчивого использования природных ресурсов и регионального экономического роста, основанного на экотуризме. *Приложение 14*.

Проект Меморандума о применении унифицированных современных методов инвентаризации разнообразия флоры и фауны, а также состояния экосистем в трансграничных коридорах направлен на повышение эффективности совместных природоохранных усилий и устойчивого управления экосистемами. Используя передовые технологии, документ предусматривает стандартизацию и гармонизацию данных о состоянии природных ресурсов с обеспечением сопоставимости информации между странами. Ключевые положения включают унификацию методик инвентаризации, создание совместной базы данных, координацию научных исследований и систематический обмен знаниями и результатами мониторинга. *Приложение 15*.

Соглашение о трансграничном сотрудничестве по охране ключевых видов и место обитания от пожаров и инвазивных видов между странами Центральной Азии устанавливает стратегические рамки для защиты биоразнообразия региона от лесных пожаров и инвазивных видов. Документ предусматривает совместное управление экологическими коридорами, комплексный мониторинг экосистем и систематический обмен данными для предупреждения экологических угроз и восстановления деградированных ландшафтов. Он включает институциональные механизмы, в том числе создание Региональной координационной группы, принятие единого плана управления и мобилизацию международной технической и финансовой помощи. В итоге Соглашение укрепляет региональную сплочённость, обеспечивая долгосрочное сохранение ключевых экосистем и содействуя устойчивому развитию в странах Центральной Азии. *Приложение 16.*

Протокол о применении природо-ориентированных решений для устойчивого управления ландшафтами и повышения устойчивости экосистем, направлен на противодействие эрозии почв, восстановление деградированных ландшафтов и повышение устойчивости региональной инфраструктуры за счёт коллективных действий и стратегического сотрудничества. Протокол формирует основы нормативного финансирования, предусматривает создание надёжной системы мониторинга и учреждение Координационного совета для координации реализации данных инициатив. *Приложение 17*.

Меморандум о создании трансграничного «Парка мира» способствует совместному управлению парками, обмену данными, вовлечению местных сообществ и формированию устойчивых финансовых механизмов. Особое внимание уделяется восстановлению миграционных коридоров животных, охране биоразнообразия, внедрению международных стандартов и учёту интересов местных сообществ. Документ также предусматривает разработку долгосрочных планов управления, комплексных протоколов мониторинга экосистем и привлечение международной поддержки. *Приложение 18.*

Проект Протокола о региональной системе раннего предупреждения лесных пожаров направлен на укрепление сотрудничества и координации между участвующими государствами в сфере профилактики пожаров и реагирования на чрезвычайные ситуации. Основными целями Протокола являются обеспечение синхронизированных действий, повышение оперативной готовности и снижение социально-экологических последствий лесных пожаров. Ключевые положения включают разработку единой системы мониторинга и оповещения, создание протоколов обмена информацией в режиме реального времени, проведение совместных полевых учений и укрепление технического и материального потенциала. *Приложение 19***.**

Разработка и обсуждение указанных документов начались до запуска проекта KG RESILAND. Вопрос согласования документов был рассмотрен на заседании Регионального консультативного комитета 13 мая 2025 года в Ашхабаде (Туркменистан). В отчётный период Таджикистан и Туркменистан представили свои комментарии. Остальные три страны сообщили, что их ответы будут предоставлены в ближайшее время. В ходе Регионального семинара, проведённого в Ташкенте, все шесть документов были рассмотрены в тематических рабочих группах с целью подготовки дорожной карты по каждому документу. Результаты обсуждений представлены в *Приложении 20.*

3.2 Региональное мероприятие по гармонизации политик

Цель 2025 по проектам TJ & UZ RESILAND: 1 Статус: Выполнено

Региональный диалог по восстановлению устойчивых ландшафтов в Центральной Азии с акцентом на гармонизацию политик, состоялся 9–10 декабря 2025 года в г. Ташкент, Республика Узбекистан. Мероприятие было инициировано ОРП RESILAND UZ от имени Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Инициатива была поддержана и софинансирована ОРП RESILAND TJ от имени Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.

В работе Диалога приняли участие 54 представителя государственных органов, ответственных за управление земельными, лесными и природоохранными ресурсами, из всех пяти стран Центральной Азии. Кыргызская Республика была представлена двумя делегатами от Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и одним делегатом от Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.

Мероприятие поддержало обмен опытом в сфере управления лесами, пастбищами и особо охраняемыми природными территориями. РЭЦЦА обеспечил проведение специализированной сессии, направленной на продвижение гармонизации шести региональных политик и разработку дорожных карт по их гармонизации.

3.3 Онлайн-платформы

Цель 2025 по проектам TJ & UZ RESILAND: 2 проекта платформа

Статус: в стадии разработки

3.3.1 Веб-страница RESILAND CA+ на сайте РЭЦЦА

Веб-страница RESILAND CA+ на сайте РЭЦЦА была разработана в 2024 г. как специализированное информационное пространство проекта на официальном веб-ресурсе РЭЦЦА. Она включает общую страницу программы RESILAND CA+ с интерактивной лентой новостей, информационными материалами и панелями мониторинга (дашбордами), предназначенными для демонстрации реализуемых мероприятий, предпринимаемых усилий и достигнутых результатов.



Рисунок 13. Скриншот с веб-страницы RESILAND CA+ на CARECECO.ORG

Веб-страница также содержит отдельные разделы для каждого проекта RESILAND. В них размещены новости, информация о проектной деятельности, материалы, публикации, интервью, а также панели мониторинга (дашборды) с аналитическими отчётами о достигнутых результатах.



Рисунок 14. Скриншоты страницы проекта KG RESILAND на CARECECO.ORG

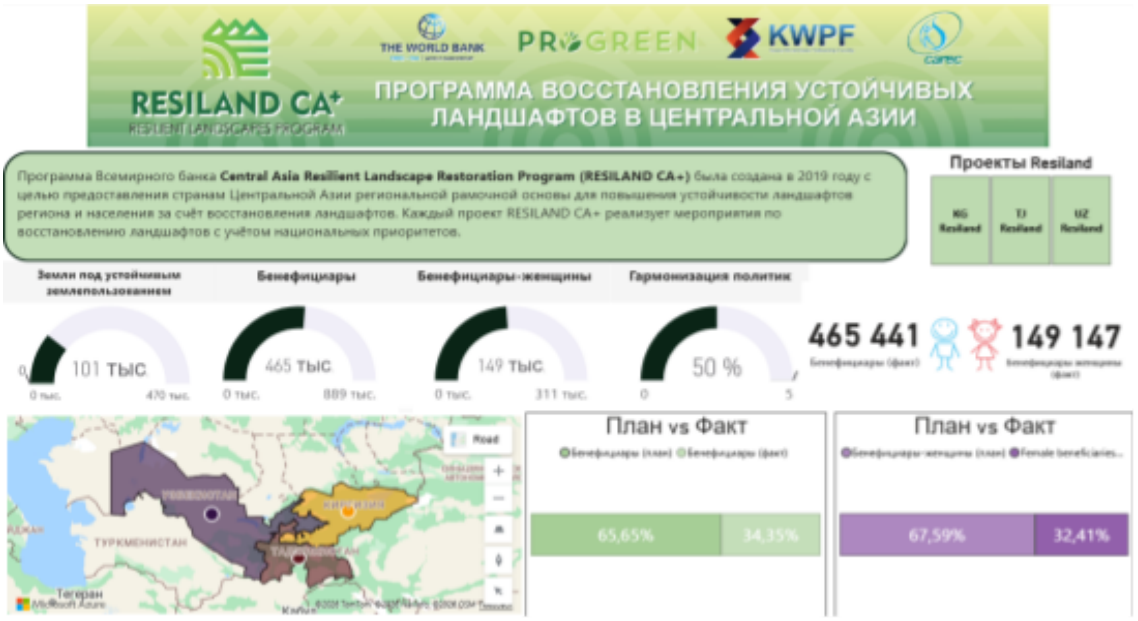


Рисунок 15. Панели мониторинга (дашборды) консолидированных индикаторов по трём проектам RESILAND на странице RESILAND CA+ на CARECECO.ORG

3.3.2 Портал по ландшафтам RESILAND CA+

Цель 2025 по проекту TJ RESILAND: Концепция портала **Статус: Выполнено**

По запросу миссии Всемирного банка (ВБ) в 2025 г. РЭЦЦА начал разработку специализированного Портала RESILAND CA+, в качестве «Центра знаний по ландшафтам в Центральной Азии". Портал предназначен для консолидации критически важной информации о состоянии ландшафтов, реализуемых стратегических мерах и передовых практиках, а также для интеграции накопленного практического опыта и создания сообщества практиков. Обеспечивая прозрачность данных и предлагая комплексный набор инструментов мониторинга и оценки, платформа нацелена на содействие фундаментальным изменениям в региональных практиках землепользования, тем самым способствуя формированию долгосрочной устойчивости и сотрудничества.



Рисунок 16. Прототип портала RESILAND CA+

Концептуальная модель и структурные прототипы платформы были представлены на заседании РКК в г. Ташкент 10 декабря 2025 года. Архитектура портала предусматривает упрощённый и интуитивно понятный интерфейс с отдельными модулями для проектов, управления знаниями и централизованных баз данных, адаптированными под потребности государственных

органов, научного сообщества и гражданского общества. Существенным аналитическим преимуществом является интеграция панелей мониторинга Power BI для отслеживания индикаторов по ландшафтам, что обеспечит доступ к страновым обзорам и аналитике.Для обеспечения региональной инклюзивности платформа предусматривает полную многоязычную поддержку на английском, русском и пяти национальных языках стран Центральной Азии, а также техническую оптимизацию для условий с низкой пропускной способностью интернет-соединения. Расширенный функционал включает поиск с использованием технологий искусственного интеллекта с полнотекстовой индексацией различных форматов документов, интегрированный календарь мероприятий и защищённую интеграцию с социальными сетями. Надёжность системы обеспечивается строгими административными протоколами, включая SSL-шифрование и автоматическое резервное копирование с избыточностью.

В целом структура портала соответствует примерно 80% международных стандартов лучших практик, при этом сохраняя уникальные региональные модули, что позиционирует его как ведущую, ориентированную на пользователя платформу для развития двустороннего диалога и стимулирования системных улучшений в сфере устойчивого экологического управления в Центральной Азии.

Портал будет размещать ключевые результаты проекта KG RESILAND, в частности: Руководство и рекомендации по природосберегающим решениям (D.2), Региональную дорожную карту по смягчению последствий селей, имеющих трансграничный характер, и Инвестиционный план (D.3). По согласованию с ОРП и членами РКК, здесь также может быть размещен, Онлайн-каталог текущих и будущих климатических стихийных бедствий трансграничного характера в Центральной Азии (D.1).

3.3.3 Региональная онлайн-база данных

Цель 2025 проекта UZ RESILAND: Концепция **Статус: В стадии разработки**

Основной целью разработки региональной онлайн-базы данных является предоставление региональным заинтересованным сторонам упрощённого доступа к систематизированной информации. Данная база данных станет неотъемлемым компонентом Портала RESILAND CA+, формируя комплексную систему сбора, хранения и публикации данных.

База данных будет оснащена интерактивным и удобным для пользователя интерфейсом, разработанным с учётом интуитивной понятности и доступности для всех категорий пользователей независимо от уровня их технической подготовки. Она будет иметь простую и логичную структуру с наглядной навигацией, что обеспечит оперативный поиск информации с использованием функций быстрого поиска и фильтрации данных.

Такой продвинутый подход позволит региональной базе данных выйти за рамки статичного хранилища информации и превратиться в активный инструмент стимулирования сотрудничества, гармонизации политик и обмена знаниями в регионе. Сочетание хорошо организованной системы управления контентом с расширенными интерактивными возможностями позволит позиционировать платформу как ключевой ресурс для устойчивого управления ландшафтами в Центральной Азии.

В настоящее время концепция базы данных находится в стадии разработки.

3.4 Региональные системы поддержки

Региональные системы, созданные и функционирующие под управлением РЭЦЦА в целях обеспечения взаимодополняемости и повышения видимости проектов RESILAND в Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане в рамках программы RESILAND CA+, включают следующие компоненты: 1. Система мониторинга и оценки; 2. Система коммуникаций и визибилити; 3) Система координации.

3.4.1 Система мониторинга и оценки индикаторов регионального компонента

В отчётный период были разработаны и внедрены следующие системы мониторинга и оценки (МиО) для проектных индикаторов:

1. Система МиО для индикаторов, за которые несёт ответственность РЭЦЦА в рамках проекта KG RESILAND.
2. Прототип объединенной системы МиО для программы RESILAND CA+, для сбора и консолидации показателей по трём проектам: RESILAND в Кыргызской Республике, RESILAND в Таджикистане и RESILAND в Узбекистане.
3. Разработана концепция системы МиО для показателей, за несет ответственность ОРП KG RESILAND.

1. Описание системы мониторинга и оценки индикаторов, управляемых РЭЦЦА

Система МиО требует удобного доступа к информации и документам для ключевых членов проектной команды. С этой целью было создано общее рабочее пространство в Google Drive для РЭЦЦА и ОРП. Рабочее пространство включает подпапки по ожидаемым результатам и используется в постоянном рабочем режиме, обеспечивая доступ к последним версиям документов, списков, отчётов, планов и других материалов на всех этапах их подготовки. Рабочая папка доступна по ссылке.

Система МиО базируется на базе данных, которая размещена в рабочей папке в системе Google Drive. Шаблон базы структурирован так, чтобы в любой момент пользователи видели все целевые индикаторы и прогресс в их достижении. Кроме того, система обеспечивает систематизацию документов и отчётов, подтверждающих их разработку.

Система основана на целевых индикаторах регионального компонента проекта KG RESILAND, предусмотренных контрактом с РЭЦЦА, включая количество документов, поддерживающих гармонизацию совместных действий, количество мероприятий и количество участников. Индикаторы детализированы по различным группам и задачам, что позволяет анализировать степень их достижения с разных точек зрения.

База данных системы МиО включает следующие листы:

- Лист 1: «Guide» - краткое описание системы и инструкции по её использованию.
- Лист 2: «Project Information» — включает краткий профиль проекта с описанием его целей и задач, внутренний номер проекта, номер контракта, сроки реализации проекта, а также ссылку на страницу проекта на веб-сайте РЭЦЦА.
- Лист 3: «Dashboards» — содержит диаграммы и графики, визуализирующие прогресс в достижении целевых показателей проекта в разрезе различных

индикаторов, например: количество мероприятий по группам, количество участников по полу, а также по типу представляемых ими организаций.

- Лист 4: «Statistics» — включает таблицы, которые автоматически формируют статистические данные на основе листов «Document List», «Event List» и «Participant List» по различным задачам и аналитическим срезам. В частности, формируется статистика участников мероприятий по полу и по отчётным периодам проекта. Участники из стран, ВБ, РЭЦЦА и международных организаций учитываются раздельно. Также представляется статистика по типам организаций участников и по статусу продвижения гармонизируемых политических документов.
- Лист 5: «Document List» — содержит перечень всех документов, подготовленных в рамках проекта KG RESILAND: отчёты РЭЦЦА, отчёты экспертов, проекты документов и концепций (соглашения, меморандумы, руководства), а также их доработанные версии, способствующие гармонизации трансграничного сотрудничества. Лист обновляется по мере подготовки новых документов и включает ссылки на папки, в которых они хранятся.
- Лист 6: «Event List» — фиксирует все мероприятия, проведённые в рамках регионального компонента проекта KG RESILAND, включая заседания Регионального координационного комитета, региональные мероприятия, учебные поездки, международные конференции и Центральноазиатскую конференцию по вопросам изменения климата. В листе также указываются страна и дата проведения мероприятия, количество участников по полу, тип мероприятия и приводятся ссылки на соответствующие материалы.
- Лист 7: «Participant List» — содержит список участников с указанием их должностей и контактных данных, включая информацию о поле, стране и секторе, а также фильтры по типу мероприятия и отчётному периоду участия.
- Листы 8–11 — в целях облегчения использования информации при подготовке отчётов и презентаций листы «Dashboards» и «Statistics» также представлены на английском и кыргызском языках

Система МиО показывает, что в отчётный период в рамках проекта KG RESILAND были проведены и поддержаны следующие мероприятия: 2 заседания Регионального консультативного комитета, 1 Региональный диалог по теме устойчивых ландшафтов и гармонизации политик, 1 Международная горная конференция и 1 Летняя школа для молодых гляциологов.

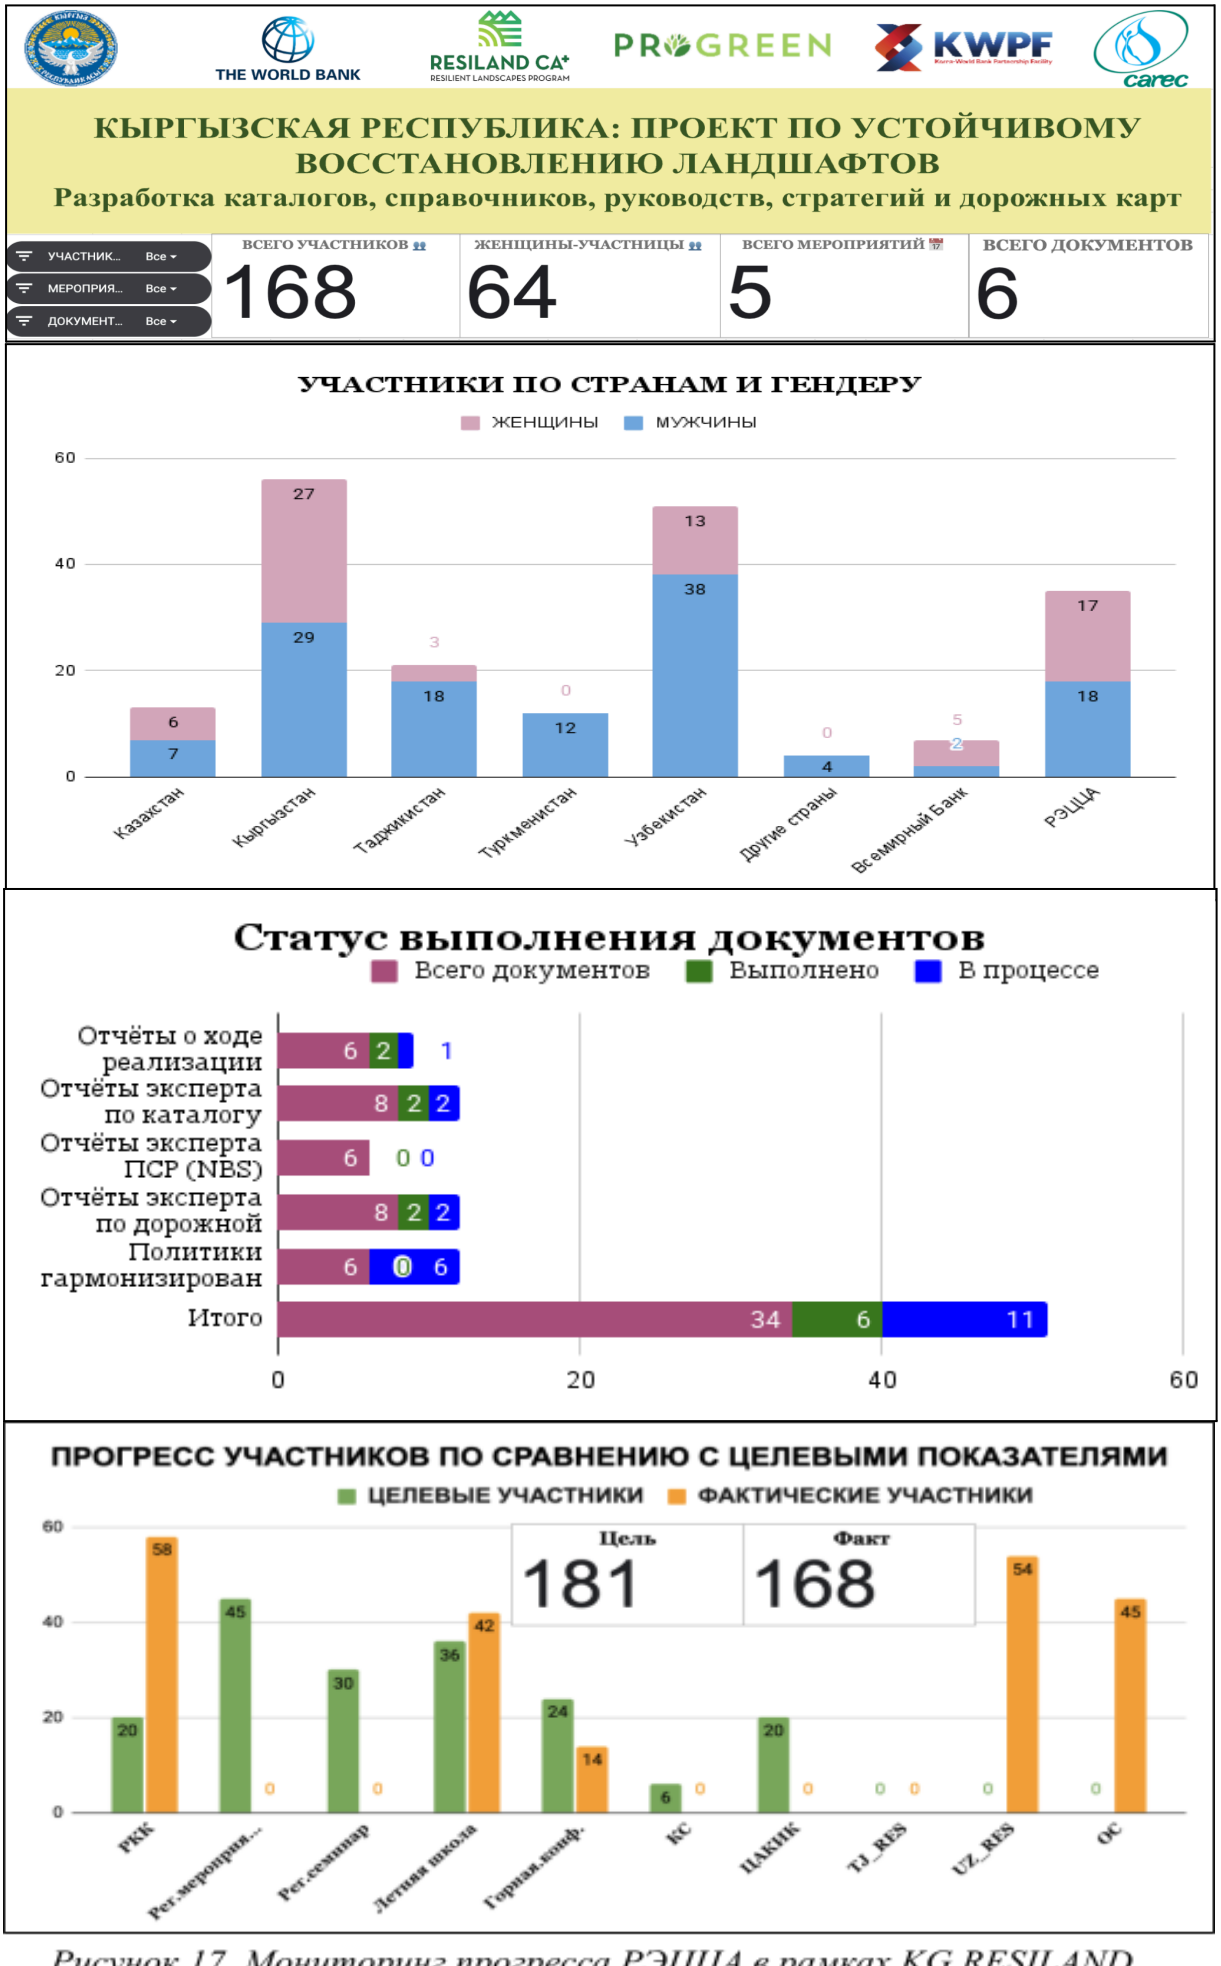


Рисунок 17. Мониторинг прогресса РЭЦЦА в рамках KG RESILAND

Кроме того, проект KG RESILAND получил выгоды от мероприятий, организованных в рамках проектов RESILAND Таджикистан и RESILAND Узбекистан, включая Центральноазиатскую конференцию по вопросам изменения климата (май 2025 года, Ашхабад) и Региональное мероприятие по гармонизации политик (9–10 декабря 2025 года). Общее число участников составило 168 человек (114 уникальных участников), в том числе 104 мужчины (62 %) и 64 женщины (38 %)

2. Региональная система МиО по объединенным индикаторам RESILAND CA+

Все три проекта RESILAND имеют общие ключевые индикаторы целей:

- площадь территорий, находящихся под практиками устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР);
- количество бенефициаров;
- количество женщин-бенефициаров;
- гармонизированные политические документы.

Исходя из общности ключевых индикаторов, РЭЦЦА разработал систему сбора данных, которая консолидирует информацию по всем трём проектам: RESILAND в Кыргызской Республике, RESILAND в Таджикистане и RESILAND в Узбекистане. Данные показатели представлены в формате «план / факт», что позволяет наглядно демонстрировать прогресс в их совокупном достижении..

Результаты функционирования региональной системы МиО представлены на веб-сайте RESILAND CA+ (см. Рисунок 13 выше). В настоящее время система отражает прогресс на основе данных проекта RESILAND TJ так как данных по индикаторам по другим проектам пока у РЭЦЦА нет.

В систему МиО РЭЦЦА может включить не только сбор по целевым индикаторам, но и возможность более глубокого анализа. В частности: анализ используемых практик использования земельных ресурсов, анализ бенефициаров RESILAND CA+, анализ по видам получаемых выгод.

Статистика по практикам и технологиям SLM	Территория изменений				Цель			Статус		Характер		
	агрономический	экологический процесс	гидрологический процесс	XXX	реставрация	консервация	управление	новая практика SLM	улучшения существующей практики SLM	технология	подход	Инфраструктура (дороги, мосты, ограждения и т.д.)
	Га	Га	Га	Га	Га	Га	Га	Га	Га	Га	Га	Га
Компонент 1												
Компонент 1												
Компонент 1												
Компонент 1												
Промежуточный итог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Матрица сбора статистики по практикам и технологиям землепользования

Статистика по ГРУППАМ	Совокупные статистические данные					Статистика по группам (пользователи пастбищ, пользователи лесов, группы по общим интересам)							
	Количество групп	Количество групп, в которых женщины занимают руководящие должности	Количество домохозяйств, охваченных группами	Количество бенефициаров в группах	Количество бенефициаров (женщины)	Группа XXX	Возглавляемые мужчиной	Преимущественно мужчины (более 50%)	Возглавляемые женщиной	Преимущественно женщины (более 50%)	Количество домохозяйств	Количество бенефициаров	Количество бенефициаров (женщины)
Районы	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер
XXX													
XXX													
XXX													
Всего													

2. Матрица сбора статистики по выгодам

Статистика по выгодам	Всего бенефициаров			Тип выгод 1			Тип выгод 2	
	Количество групп	Количество бенефициаров	Всего женщин	Денежные (финансовые) выгоды	Неденежные выгоды	Занятость	Доход	Благополучие
Районы	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер
XXX								
XXX								
XXX								
Всего				0	0	0	0	0

3. Матрица сбора статистики по бенефициарам

3. Система МиО для индикаторов, управляемых ОРП

Используя свой опыт поддержки разработки системы мониторинга и оценки для проекта RESILAND TJ, РЭЦЦА представил соответствующую концептуальную модель команде ОРП в Кыргызской Республике в рамках серии онлайн-технических консультаций. РЭЦЦА разработал комплексное видение системы МиО, применимое ко всем проектам RESILAND, и готов оказывать поддержку её интеграции в повседневную операционную деятельность ОРП.

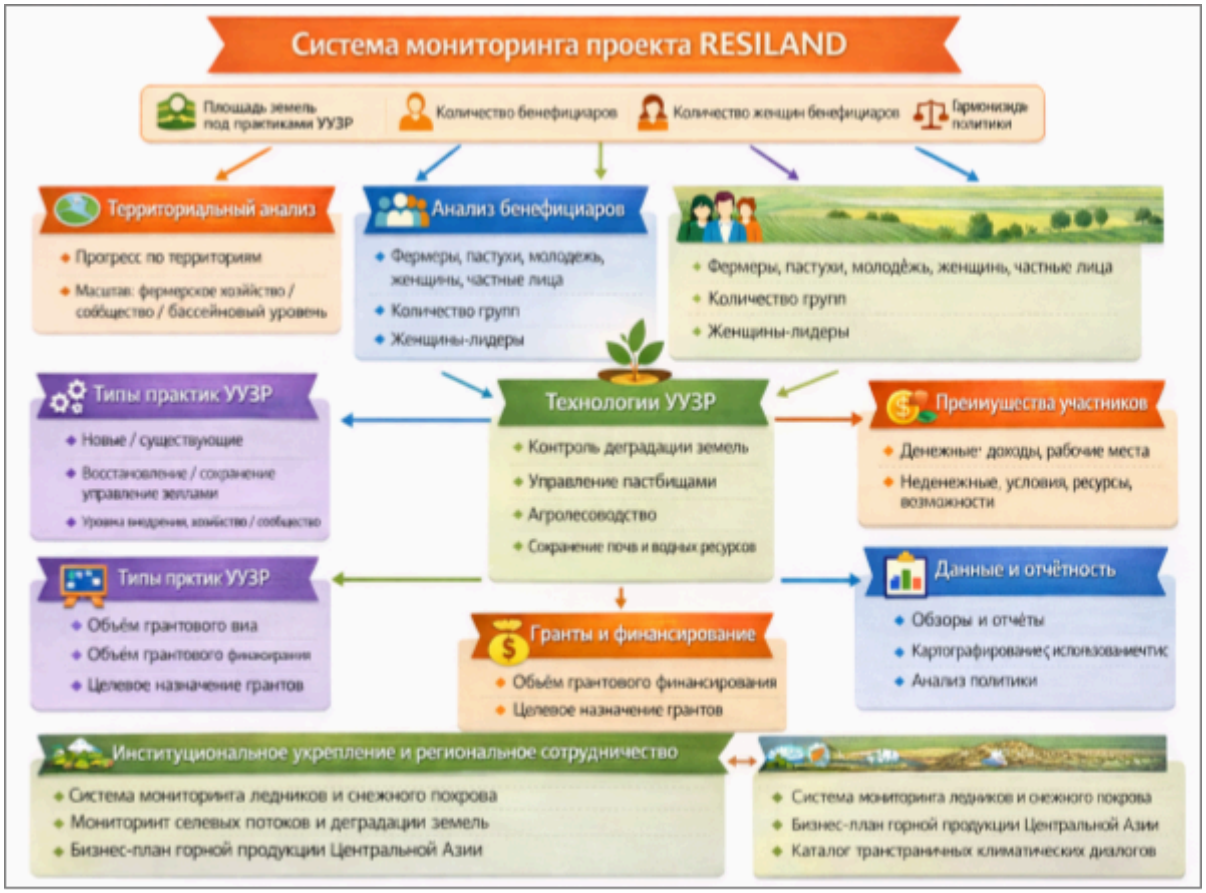


Рисунок 18. Рамочная система мониторинга проекта RESILAND CA+



Рисунок 19. Система обмена информацией RESILAND CA+

3.4.2 Визибилити и коммуникация

В отчётный период в рамках поддержки визибилити и и коммуникаций были достигнуты следующие результаты:

1. Налажена координация с ОРП;
2. Определены коммуникационные каналы и платформы;
3. Подготовлены и распространены 14 информационных материалов.

1. Координация с ОРП

РЭЦЦА обеспечивает согласованный и своевременный поток информации проектов RESILAND CA+ по всей Центральной Азии. Механизм координации включает следующие элементы:

- РЭЦЦА ведет коммуникацию на региональном уровне, разрабатывает единый брендинг и шаблоны, подготавливает региональные коммуникационные продукты и координирует их распространение.
- Национальные коммуникационные координаторы представлены пресс-службами реализующих министерств и партнёров в странах. Они осуществляют национальные коммуникации, адаптируют региональные сообщения для местной аудитории и обеспечивают информационное освещение мероприятий RESILAND.

Система основана на постоянной двусторонней коммуникации. Национальные координаторы передают в РЭЦЦА новости, цитаты, изображения, интервью, пресс-релизы и материалы медиамониторинга. В свою очередь, коммуникационный координатор РЭЦЦА предоставляет региональные обновления, коммуникационные материалы и методические рекомендации для поддержки национального информационного охвата. Кроме того, сотрудники подразделений по внешним связям ВБ в соответствующих столицах заранее информируются о мероприятиях, финансируемых в рамках RESILAND CA+, проводимых на национальном или региональном уровне, с целью обеспечения коммуникационной поддержки.

2. Коммуникационные каналы и платформы

В 2025 году программа RESILAND CA+ / KG RESILAND успешно продвинулась в реализации Региональной коммуникационной стратегии, достигнув установленных коммуникационных целевых показателей на 2025 год - 14 публикаций с охватом аудитории более 7000 человек. Использование унифицированных хэштегов и систематическая отметка официальных аккаунтов ВБ позволили расширить охват программы и обеспечить согласованность брендинга: #RESILAND CA+ #World Bank #landscape restoration #climate change #KG RESILAND.

Facebook

- https://www.facebook.com/WorldBankEuropeCentralAsia/
- https://www.facebook.com/WorldBankKyrgyzRepublic
- https://www.facebook.com/pages/The-Regional-Environmental-Centre-for-Central-Asia-CAREC/102585569825985?fref=ts
- https://www.facebook.com/share/14RBnvw46AL/

X

- https://x.com/WorldBankECA

- https://twitter.com/recca_carec

LinkedIn

- https://www.linkedin.com/company/the-world-bank/posts/
- https://www.linkedin.com/company/2561368/

Была открыта страница проекта на веб-сайте CARECeco.org наусском и английском языках, который обеспечил централизованную платформу для доступа к информации, связанной с программой. Страница веб-сайта проекта регулярно обновлялась и способствовала повышению прозрачности реализации проекта и вовлечённости заинтересованных сторон.

2. Распространение информации



Рисунок 20. Ежемесячный инфо бюллетень №1

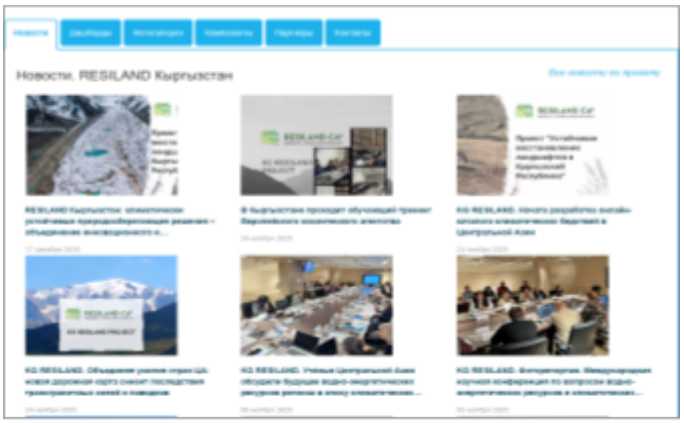


Рисунок 21. Страница веб-сайта проекта на CARECECO.ORG

В отчётный период были выпущены 2 ежемесячных региональных информационных бюллетеня на русском и английском языках, ещё 2 выпуска находятся в стадии подготовки. Подготовлены и распространены шесть тематических публикаций, продвигающих проект KG RESILAND и охватывающих вопросы регионального сотрудничества, климатической устойчивости, восстановления земель, а также международные памятные даты, такие как Всемирный день почв. Эти материалы способствовали донесению как технического прогресса реализации проекта, так и региональной значимости инициатив программы.

- Всемирный день почв: страны Центральной Азии объединяются для восстановления деградированных экосистем
- RESILAND Кыргызстан: климатически устойчивые природосберегающие решения — объединение инновационного и традиционного подходов в восстановлении ландшафтов
- Батыр Мамедов: программа RESILAND CA стала важной частью экологической и климатической повестки стран Центральной Азии RESILAND KG
- Региональный портал управления знаниями в ЦА: всё о RESILAND CA+ и устойчивом развитии региона
- RESILAND Кыргызстан: восстановление ландшафтов и укрепление климатической устойчивости

- KG RESILAND. Учёные Центральной Азии обсудили будущее водно-энергетических ресурсов региона в эпоху климатических изменений
- KG RESILAND. Объединяя усилия стран ЦА: новая дорожная карта снизит последствия трансграничных селей и паводков

Всего через платформы РЭЦЦА и ЦАКИП было распространено 14 публикаций. Тематика материалов охватывала разработку регионального каталога климатически обусловленных стихийных бедствий, подготовку региональной дорожной карты по снижению рисков селевых потоков и паводков, проведение научных конференций, а также вопросы восстановления деградированных земель. Совокупный охват данных материалов составил 7 179 человек через веб-сайты и социальные сети.

Канал	**Количество публикаций**	**Охват**
Веб-сайты РЭЦЦА/ЦАКИП	14	600
Социальные сети РЭЦЦА/ЦАКИП	14	6 579
Итого	28	7 179

4. ПРОБЛЕМЫ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ

Консультационные услуги по укреплению регионального сотрудничества в рамках проекта KG RESILAND по контракту № KG/CS/RESILAND/MOES/DS-01 «Разработка каталогов, справочников, стратегий и дорожных карт в рамках сотрудничества с Региональным экологическим центром Центральной Азии», заключённому между Министерством по чрезвычайным ситуациям Кыргызской Республики (МЧС КР) и РЭЦЦА в рамках проекта «Устойчивое восстановление ландшафтов в Кыргызской Республике», реализуются максимально в соответствии с утверждённым рабочим планом.

Единственное исключение составляет работа по D.2 разработка Руководства и рекомендаций по ПСР, с целью расширения применения ПСР при реагировании на селевые потоки, паводки и другие климатически обусловленные явления в Центральной Азии. Реализация мероприятий начнется в 2026 году, что позволит ОРП завершить сбор и систематизацию информации о практиках ПСР, применяемых в Кыргызской Республике которые являются базовой информацией для РЭЦЦА и неключевого эксперта.

5. ОБНОВЛЕНИЯ В КОМАНДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЭЦЦА

В текущий отчётный период в составе команды РЭЦЦА, задействованной в реализации проекта KG RESILAND, произошли следующие изменения:

- Батыр Мамедов был назначен Руководителем группы проекта в связи с его назначением на должность Исполнительного директора РЭЦЦА;
- Диловаршо Дустзода покинул должность Заместителя руководителя группы в связи с его переводом на должность Советника Исполнительного директора РЭЦЦА;
- Людмила Киктенко была назначена Заместителем руководителя группы, в связи с чем покинула должность Специалиста МиО;
- Аиша Мухамедрахим была назначена Специалистом МиО проекта.

6. ПРИОРИТЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД

Приоритетными направлениями РЭЦЦА по проекту KG RESILAND в 2026 году станут:

- D.1 Разработка Онлайн-каталога текущих и будущих климатических стихийных бедствий трансграничного характера в Центральной Азии;
- D.2 Разработка Руководство и рекомендации по природосберегающим решениям (ПСР) для расширения использования ПСР в борьбе с селями, паводками, оползнями и другими климатически обусловленными явлениями в Центральной Азии;
- D.3 Разработка Региональной дорожной карты по смягчению последствий селей, имеющих трансграничный характер, и инвестиционный план.
- Гармонизация политик
- Региональные диалоги
- Региональные системы поддержки

D.1, D.2, D.3 В этом направлении РЭЦЦА продолжать взаимодействие с профильными министерствами пяти стран Центральной Азии для создания региональной экспертной

команды, проведения консультаций, сбора необходимой информации, обсуждения наработок консультантов, а также получения комментариев со стороны членов РКК.

Гармонизация политик: РЭЦЦА продолжит усилия по продвижению гармонизации политик. Обновлённые версии шести ключевых документов будут направлены профильным министерствам для предоставления комментариев в январе–феврале 2026 года. Обсуждение 1–2 наиболее перспективных документов будет проведено с целью их окончательного согласования до заседания Регионального консультативного комитета, запланированного к проведению на площадке Экологического саммита в апреле 2026 года в г. Астана, Казахстан.

Региональные диалоги: в рамках KG RESILAND будут проведены онлайн консультации и региональный семинар для обсуждения формата и содержания D1,D2,D3. Поддержана организация летней школы для гляциологов, участие делегации Кыргызстана на КС-31 РКИК ООН (Анталия, 9-20 ноября 2026). ЦАКИК-2026 будет проведен на площадке Регионального (Астана, 22-24 апреля 2026). в программу ЦАКИК будет включено две сессии RESILAND: 1) открытая сессия на 150-200 человек для демонстрации прорывных достижений ЦА региона по ландшафтам 2) закрытое совещание РКК.

МиО для региональной видимости результатов: РЭЦЦА сохраняет приверженность повышению региональной представленности национальных результатов путём консолидации информации и её представления через интерактивные панели мониторинга (дашборды) на портале RESILAND.

Коммуникация и визибилити: В целях усиления коммуникационной стратегии и общей видимости, включая продвижение методологии ОСОП («Одно село — один продукт»), РЭЦЦА в консультации с Группой реализации проекта и командой ВБ в Кыргызской Республике обновит региональный коммуникационный план, в котором будут определены роли, правила и сроки для всех сторон, участвующих в подготовке, обсуждении и согласовании коммуникационных материалов.

Онлайн инструменты: будет создан Портал RESILAND CA+ и прототип Региональной база данных по ландшафтам



Рисунок 22. Система мониторинга и оценки дорожной карты RESILAND CA+

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Электронные копии приложений доступны в Google папке проекта (ссылка https://clck.ru/3Rf3M8) или по запросу на почту info@carececo.org

Приложение 1. Обновлённая логическая матрица

Приложение 2. План действий к Годовому отчёту за 2026 год

Приложение 3. Контракт с консультантом по разработке Онлайн-каталога

Приложение 4. Вводный отчёт эксперта по разработке Онлайн-каталога

Приложение 5. Отчёт по консультациям с заинтересованными сторонами по разработке Онлайн-каталога

Приложение 6. Контракт с консультантом по разработке Региональной дорожной карты

Приложение 7. Вводный отчёт эксперта по разработке Региональной дорожной карты

Приложение 8. Проект аналитического обзора по селевым потокам и паводкам

Приложение 9. Комплексный обзор политик и мер по смягчению последствий селей и паводков в Центральной Азии, с анализом пробелов

Приложение 10. Отчёт о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон

Приложение 11. Краткая информация о конференции, программа и список участников

Приложение 12. Письмо-запрос РЭЦЦА о проведении консультаций с заинтересованными сторонами

Приложение 13. Протокол заседания Регионального консультативного комитета от 10.12.2025

Приложение 14. Проект Меморандума о взаимопонимании о пересечении границ в целях природного туризма на особо охраняемых природных территориях и уникальных природных объектах

Приложение 15. Проект Меморандума о применении унифицированных современных методов инвентаризации разнообразия флоры и фауны, а также состояния экосистем в трансграничных коридорах

Приложение 16. Соглашение о трансграничном сотрудничестве по охране ключевых видов и место обитания от пожаров и инвазивных видов между странами Центральной Азии

Приложение 17. Проект Протокола о применении природо-ориентированных решений для устойчивого управления ландшафтами и повышения устойчивости экосистем

Приложение 18. Меморандум о создании трансграничного «Парка Мира»

Приложение 19. Проект Протокола о региональной системе раннего предупреждения лесных пожаров

Приложение 20. Отчёт Регионального совещания по гармонизации политик 9–10.12.2025

Приложение 1. Обновленная логическая матрица

Цели	Задачи	Индикаторы	Базовое значение (июнь 2025 г.)	Целевое значение (декабрь 2028 г.)	Статус на момент отчётности (декабрь 2025 года)
Содействие сотрудничест-ву Кыргызской Республики со странами Центральной Азии в сфере трансграничного восстановления ландшафтов	Разработка региональных каталогов, справочников, руководств, стратегий и дорожных карт в сотрудничестве с Региональным экологическим центром Центральной Азии	Количество разработанных онлайн-каталогов текущих и будущих климатических стихийных бедствий трансграничного характера в Центральной Азии	0	1 (D.1.)	Консультант Кыдыр Назаркулов был привлечён 29 октября 2025 года. Согласно ТЗ эксперта, выполнены следующие задачи: 1. Вводный отчет консультанта с описанием методологии выполнения задания - подготовлен и согласован ОРП 2. Отчёт о консультациях с заинтересованными сторонами, обобщающий результаты, выводы и требования к каталогу (D.1.1) - подготовлен, предоставлен в ОРП консультантом, включен в годовой отчет РЭЦЦА за 2025 год (приложение 5) 3. Подготовлены вопросы для онлайн консультации с номинированными специалистами линейных министерств пяти стран региона для налаживания контактов и получения первой информации
		Количество разработанных руководств и рекомендаций по ПСР для расширения их применения в борьбе с селевыми потоками, паводками, и другими климатически обусловленными явлениями в ЦА	0	1 (D.2.)	По запросу ОРП начало работ запланировано на 2026 год
		Количество разработанных региональных дорожных карт по смягчению последствий селей,	0	1 (D.3.)	Консультант Жыргалбек Укашев был привлечён 1 ноября 2025 года. Согласно ТЗ эксперта, выполнены следующие задачи:

Цели	Задачи	Индикаторы	Базовое значение (июнь 2025 г.)	Целевое значение (декабрь 2028 г.)	Статус на момент отчётности (декабрь 2025 года)
		имеющих трансграничный характер, и инвестицион ных планов			1. Вводный отчет консультанта с описанием методологии выполнения задания - подготовлен и согласован ОРП 2. Аналитический обзор по селям и паводкам, имеющим трансграничный характер - подготовлен, предоставлен в ОРП консультантом, включен в годовой отчет РЭЦЦА за 2025 год (приложение 8) 3. Комплексный обзор политик по смягчению последствий селей и отчёт об анализе пробелов (D.3.1) - подготовлен, предоставлен в ОРП консультантом, включен в годовой отчет РЭЦЦА за 2025 год (приложение 9) 4. Отчёт о картировании и взаимодействии заинтересованных сторон (D.3.2) - подготовлен, предоставлен в ОРП консультантом, включен в годовой отчет РЭЦЦА за 2025 год (приложение 10) 5. Подготовлены вопросы для онлайн консультации с номинированными специалистами линейных министерств пяти стран региона для налаживания контактов и получения первой информации

Цели	Задачи	Индикаторы	Базовое значение (июнь 2025 г.)	Целевое значение (декабрь 2028 г.)	Статус на момент отчётности (декабрь 2025 года)
	Провести Региональные мероприятия по обмену знаниями, сотрудничеству, исследованиям, полевой работе и обучению, направленные на укрепление регионального взаимодействия в сфере снижения и смягчения последствий природных и климатических бедствий	Количество инфо материалов размещенных о методе ОСОП на порталлах RESILAND CA+, количество получателей материалов	0 (0)	нет (D.4.1.)	
		Количество проведённых летних школ или иных соответствующих ежегод- ных региональных обучающих мероприятий для молодых специалистов из Центральной Азии	0	3 (D.4.2.)	1. Поддержано проведение «Международной научной конференции “Водные и энергетические ресурсы и климатические риски в Центральной Азии” 05.10.2025 г. Бишкек, Кыргызстан: адм-логистическая поддержка, питание 42 участников, расходы на участие 4 спикеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Подготовка новостей и интервью.
		Количество поддержанных региональных тематических мероприятий с участием представителей стран ЦА для содействия обмену знаниями и диалогу по вопросам политики	0	3 (D.4.3.)	1. Инициировано проведение Онлайн-консультации с со специалистами линейных ведомств пяти стран ЦА по разработке Онлайн каталога (D.1) и Региональной дорожной карты (D.2) 2. Офлайн семинар по D1, D2 и D3 планируется во второй половине 2026 года
		Количество проведённых заседаний РКК с участием представителей ЦА стран для обеспечения непре- рывного регионального диалога и принятия решений по снижению рисков бедствий	0	8 (D.4.4.)	Проведено 2 заседания РКК: 1. 13 мая 2025 года, Ашхабад, Туркменистан (офлайн); 2. 10 декабря 2025 года, Ташкент, Узбекистан (офлайн). Следующее заседание запланировано на апрель 2026 года на площадке Регионального экологического саммита 22-24 апреля 2026.

Цели	Задачи	Индикаторы	Базовое значение (июнь 2025 г.)	Целевое значение (декабрь 2028 г.)	Статус на момент отчётности (декабрь 2025 года)
		Количество сессий (и количество участников на каждой конференции) в рамках Международной горной конференции для предоставления платформы экспертам из Центральной Азии	0	2 (D.4.5.) (15 участников: по 3 от каждой ЦА страны)	1. Сессия по региональному сотрудничеству, на Международной конференции «Глобальный горный диалог в интересах устойчивого развития», 24–25 апреля 2025 года, Бишкек. Поддержка участия 13 номинированных участников (2 международных спикера, 9 представителей стран ЦА, 2 РЭЦЦА).
		Количество международных конференций (КС/ СОР) по вопросам окружающей среды и изменения климата, в которых была поддержана участие представителей Кыргызской Республики	0	2 (D.4.6.) (по 3 представителя КР на каждой КС	Срок выполнения не наступил. Запланировано на КС-31, 9-20 ноября 2026, Анталья
	Организовать систему мониторинга и оценки региональных индикаторов KG RESILAND	Наличие региональных показателей программы и мониторинг достижения поставленных результатов	нет	есть	1. Система МиО для индикаторов, за которые несёт ответственность РЭЦЦА в рамках проекта KG RESILAND разработана и действует. 2. Объединенная система МиО для сбора и консолидации показателей по трём проектам: KG RESILAND, RESILAND TJ и RESILAND UZ разработана и действует, но отражает только индикаторы RESILAND TJ. 3. Концепция системы МиО для показателей, за несет ответственность ОРП KG RESILAND - драфт 4. Дашборды по показателям отдельных проектов и консолидированные показатели подготовлены и доступны на сайте CARECECO.ORG

Приложение 2. Рабочий план 2026

№	Результаты	2026											
		Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
	Annual Report												
D.1. Онлайн-каталог	D.1.2. Отчёт об анализе сбора данных (структурирующий трансграничные климатические опасности, тенденции и воздействие)												
	D.1.3 Дизайн, макет и ТЗ для ИТ компании для разработки Онлайн-каталога												
	Ежемесячные отчеты о процессе разработки онлайн каталога ИТ компанией												
	Руководство пользователей Онлайн каталогом												
D.2. Руководство и методические рекомендации по природо-ориентированным решениям (ПСР)	D.2.1. Отчёт об исследовании и сборе данных для определения целей и сферы применения руководства, сборник передовых практик и практических примеров успешного применения ПСР в регионе												
	D.2.2. Отчёт по результатам анализа эффективности и соотношения затрат и выгод ПСР (для оценки эффективности, масштабируемости и рентабельности различных ПСР и наиболее целесообразных решений для Центральной Азии)												
	D.2.3. Отчет о результатах обсуждения руководство и рекомендаций по ПСР												
D.3. Региональная дорожная карта и Инвестиционный план	D.3.2. Отчёт о картировании и вовлечении стейкхолдеров (стороны, роли и обязанности, механизмы сотрудничества, рекомендации по улучшению вовлечения стейкхолдеров в проект)												
	Обзор механизмов финансирования для устранения причин селей и паводков в странах ЦА												
	Проект общей структуры дорожной карты и инвестиционного плана												
	D.3.3. Региональный семинар для сбора информации и обеспечения												

№	Результаты	2026											
		Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
	подхода, основанного на участии заинтересованных сторон												
	D.3.4. Проект дорожной карты и инвестиционного плана с РКК												
	D.3.4. Доработанный вариант дорожной карты и инвестиционного плана с РКК												
D.4.1. Распространение подхода ОСОП («Одно село — один продукт»)	Установление контактов с командами ОСОП и JICA												
	Распространение Отчета по методу ОСОП (после получения от ОРП)												
	Серия публикаций по ОСОП												
D.4.2. Летняя школа для гляциологов	Поддержка Летней школы для молодых гляциологов из Центральной Азии												
D.4.3. Региональные тематические мероприятия	Региональная встреча по обсуждению онлайн каталога, руководства по ПСР и Региональной дорожной карты												
D.4.4. Региональный консультативный комитет	Два заседания РКК (офлайн и онлайн)					23							
D.4.5. Сессии в рамках Горной конференции	Согласование проведения ЦАКИК-2027 на площадке Второго Глобального горного саммита «Бишкек+25» включая сессии RESILAND. Первые концепции мероприятий												
D.4.6. Конференции сторон (COP)	Поддержка национальной делегации на COP-2026											9-20	
D.4.7. Мониторинг региональных индикаторов и результатов	Гармонизация политик: шесть документов обновлены и разосланы в ведомства Кыргызской Республики												
	Использование ПСР по селям и паводкам включены в протокол по ПСР												
	Обсуждение хода работы по гармонизации политик												

№	Результаты	2026											
		Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
	Отчёт о гармонизации политик												
	МиО: отчёт по показателям контракта РЭЦЦА												
	МиО: показатели ОРП в региональном МиО												
	Коммуникация и видимость (C&V): обновленная стратегия												
	C&V: Ежемесячные бюллетени												
	C&V: Истории успеха на RESILAND CA+												
